

MEMORIA VALORADA PARA LA CONTRATACION DE LAS
OBRAS DE INSTALACION DE GRADAS EN CAMPO DE
FUTBOL DE TRES CREUS DE LA FDM.

- PROMOTOR: FDM.
- SITUACIÓN: Campo de Fútbol de Tres Creus, en el
Bulevar Sur y calle Campos Crespo.

(Valencia).
- SERVICIO INFRAESTRUCTURAS FDM

1.- MEMORIA

1.1.- ANTECEDENTES

La FDM pretende realizar la mejora de las instalaciones de Campo de Fútbol de Tres Creus, en el Bulevar Sur y calle Campos Crespo de Valencia, con la incorporación de un pequeño graderío que permita la presencia de espectadores en condiciones de confort y seguridad.


1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR

La instalación deportiva se encuentra en el término municipal de Valencia, y el suelo, está clasificado por el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia como SUELO URBANIZABLE, con calificación PQL Red Primaria de Espacios Libres. Jardín Metropolitano.

1.3.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y CONSTRUCTIVA.

En campo de fútbol de Tres Creus:

Suministro e instalación de 2 módulos de 11 m. de gradas de hormigón formado por losas alveolares dispuestas en tres niveles de asientos según plano adjunto.

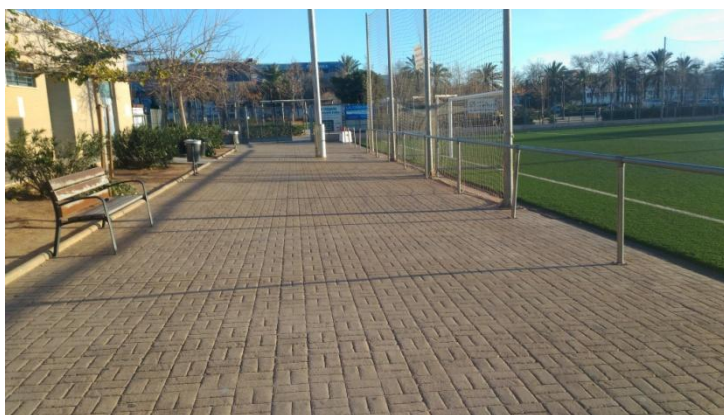

Para la instalación de gradas en el campo de fútbol será necesario realizar las siguientes actuaciones:

1. Colocación de las losas alveolares, según plano que se adjunta, y calzado de las mismas con juntas de neopreno para darles estabilidad.
2. Eliminación de elementos en losas de hormigón que pudieran ser peligrosos mediante el pulido y refino de cantos. Formación de peldaños en 4 escaleras de grada
3. Sellado de las juntas.
4. Colocación de barandilla en testeros de las gradas.

Se admitirá cualquier posible variación de los soportes de gradas siempre que se justifiquen técnicamente y sean aprobados por los técnicos de la FDM.

I.5.- PRESUPUESTO.

1.	22 m de suministro e instalación de gradas de hormigón en campo de futbol	8.300,00 €
		10000
PRESUPUESTO GENERAL CON 21% IVA		10.043,00 €

Se estima el siguiente presupuesto en 10.043,00 € IVA incluido.



Están incluidas en este presupuesto todas las obras, cálculos, legalizaciones, direcciones de obra, seguridad y salud y todo aquello necesario para poder acometer la misma.

La obra se entregará totalmente terminada, en condiciones de uso y seguridad para los usuarios.

En el caso de presentarse propuestas de modificación de cualquier unidad de obra, esta no supondrá variación presupuestaria de la oferta, estando cualquier sobrecoste a cargo del contratista.



Planta E: 1/500

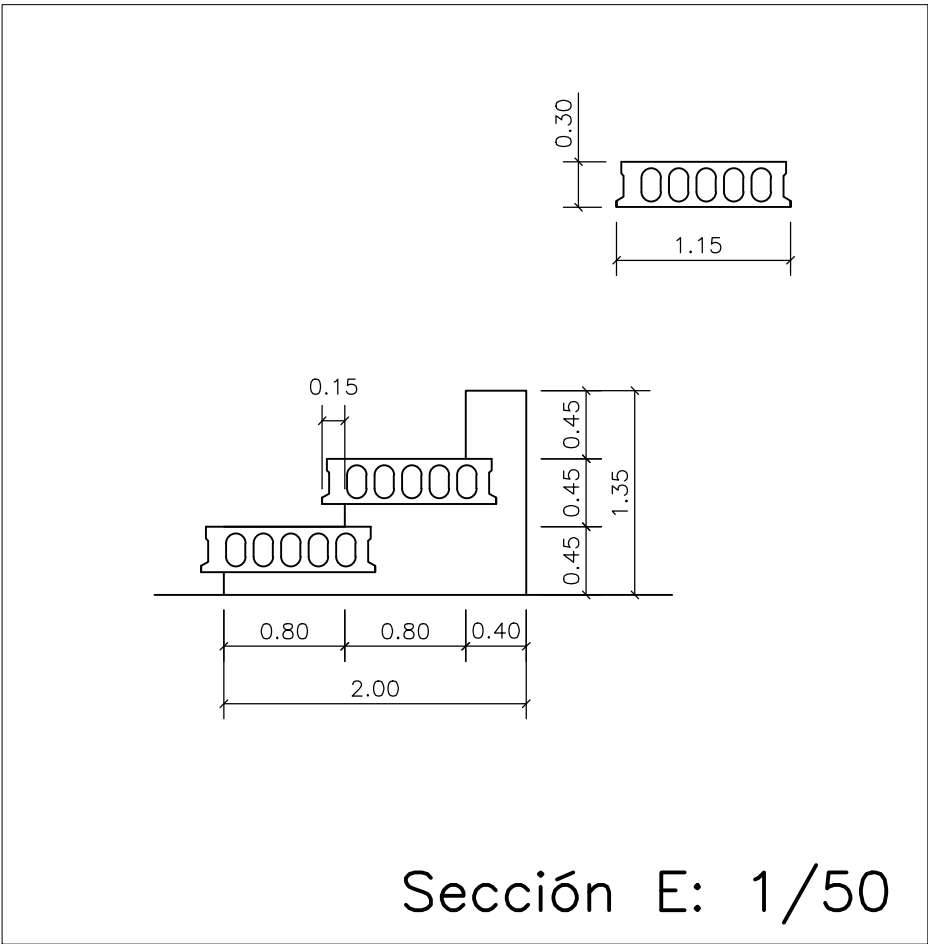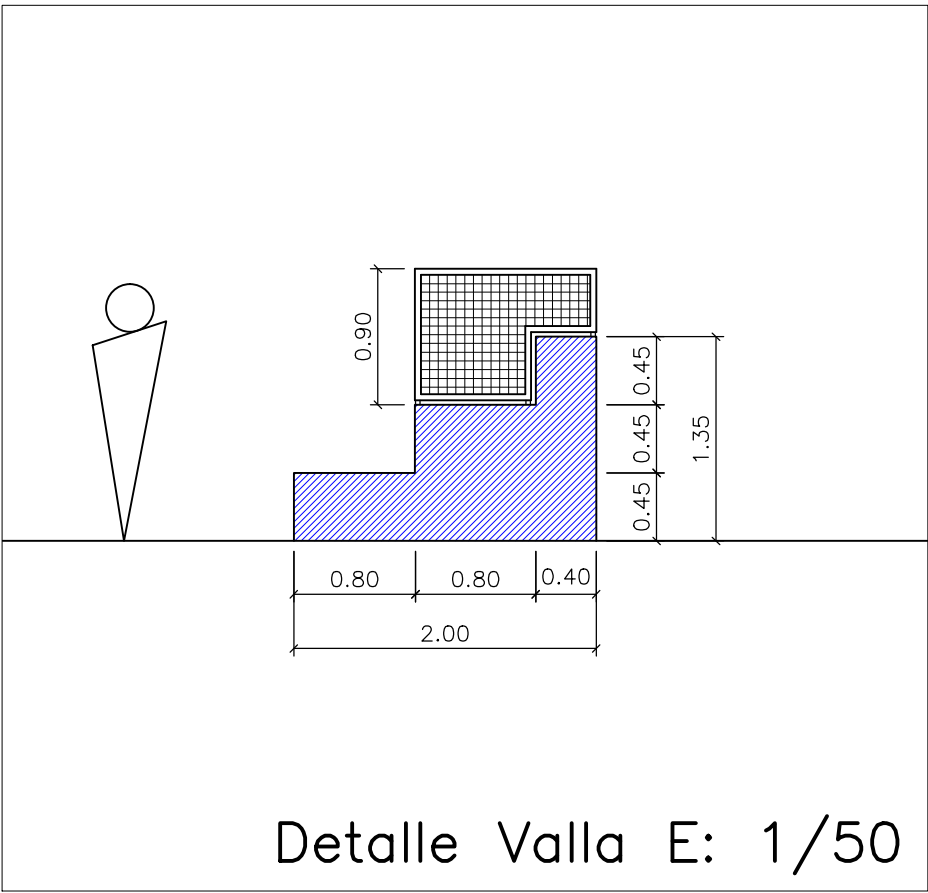

GRADAS CAMPO FÚTBOL TRES CRUCES
